



Tønsbergprosjektet


VDC-seminar Tiedemannsbyen

Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter med moderne metodikk og verktøy.




VDC i Skanska

Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter med moderne metodikk og verktøy.

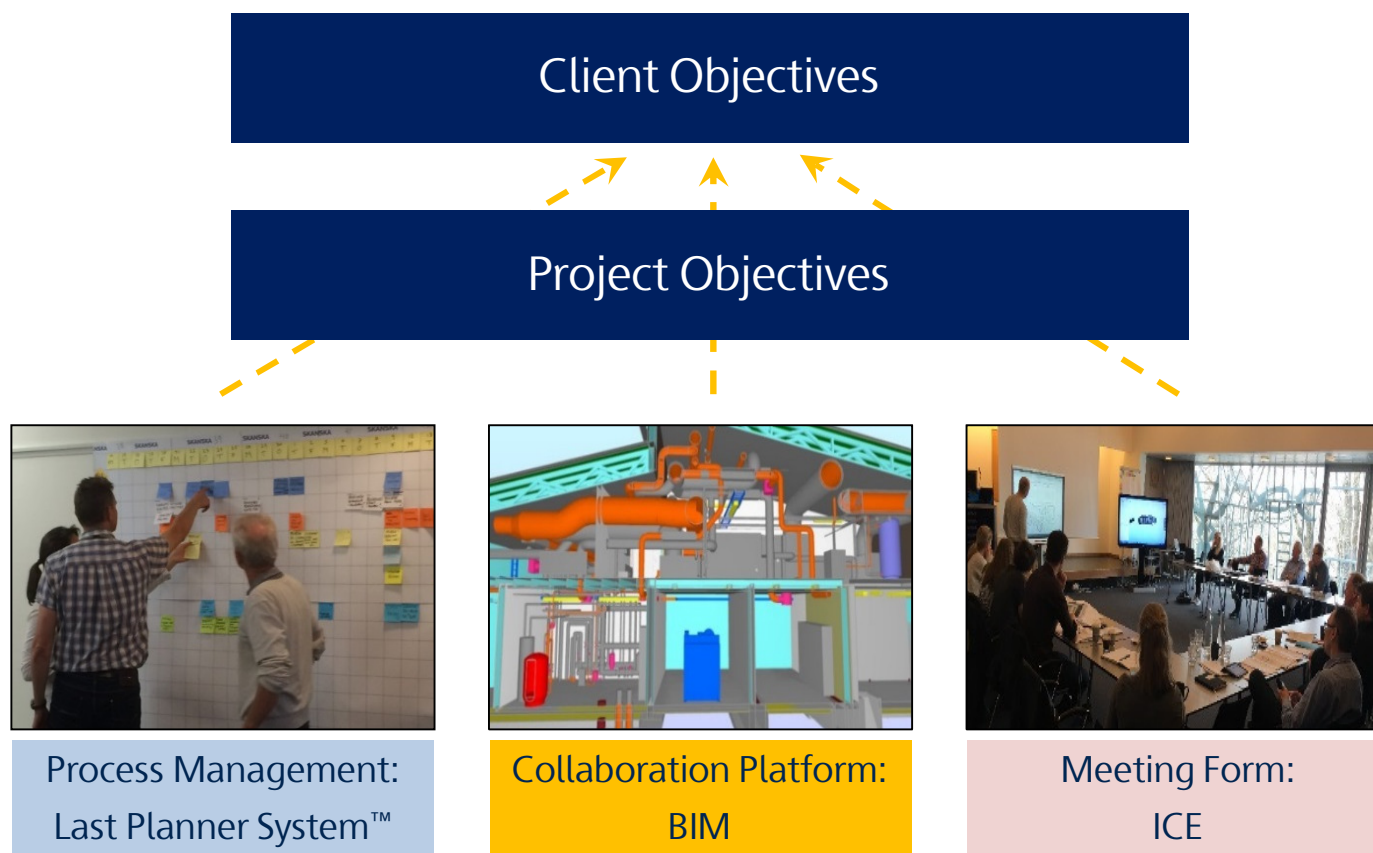


VDC er ikke verktøy, men prosess

Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter med moderne metodikk og verktøy.

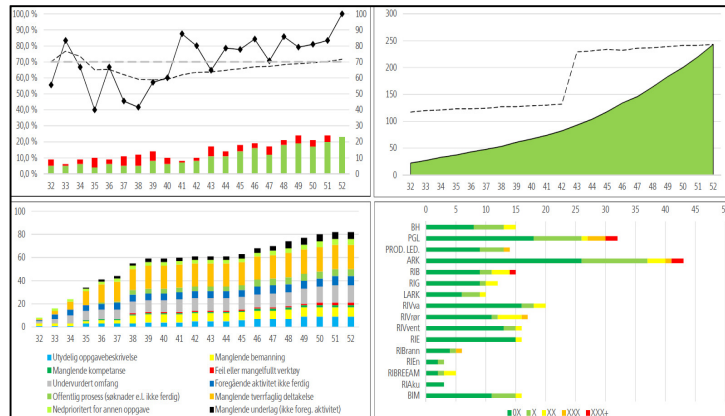

Last Planner in design

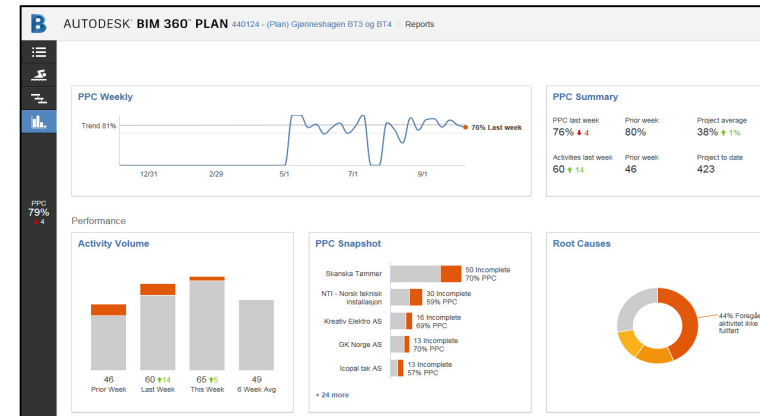


Last Planner in production

If you don't measure it, you don't manage it.

Joseph Juran


VDC i Skanska

Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter med moderne metodikk og verktøy.

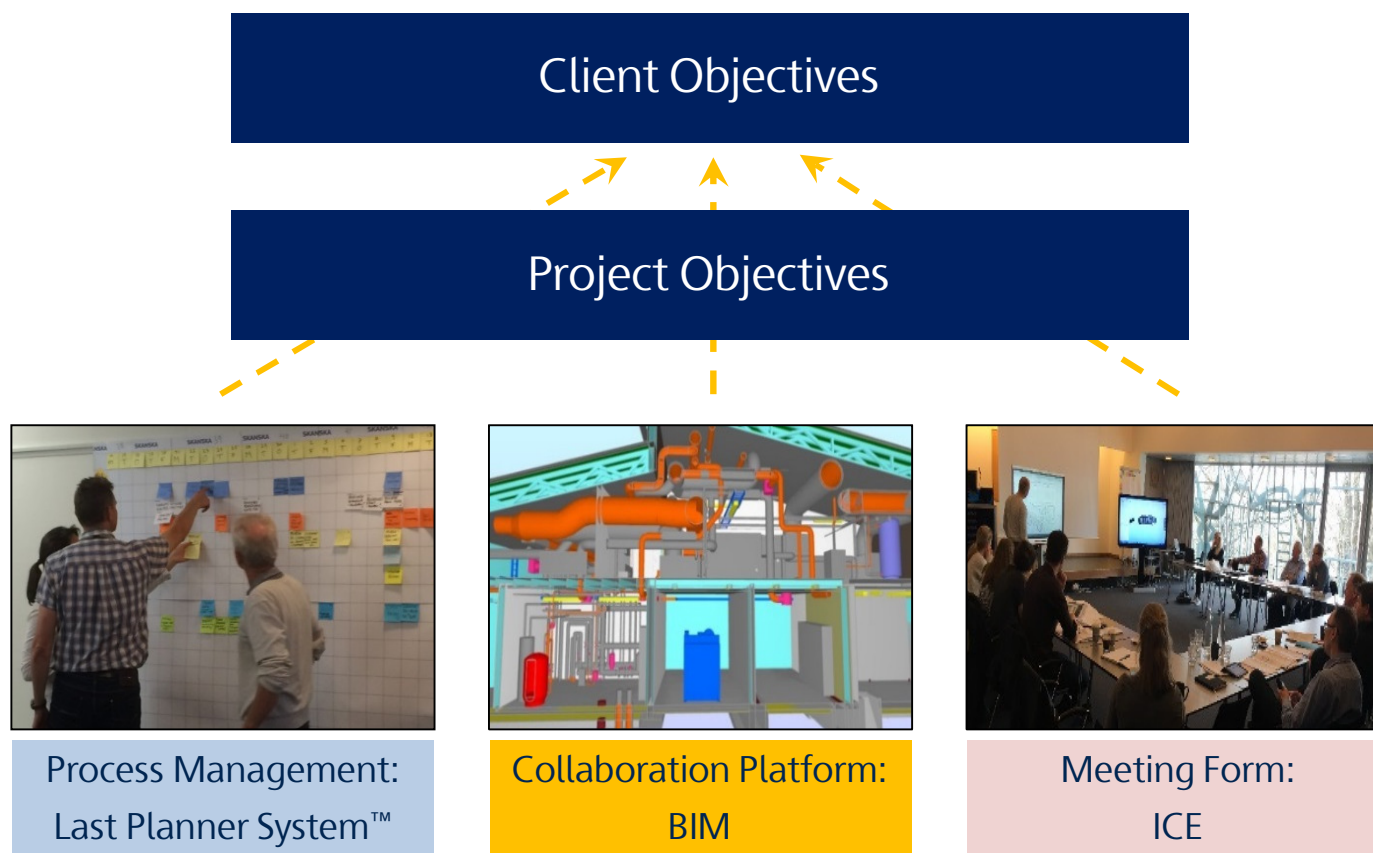

VDC i Skanska


Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter med moderne metodikk og verktøy.

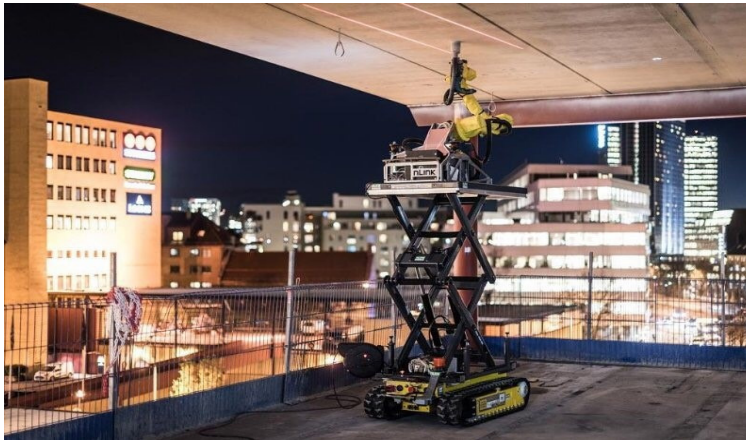


Drilling robot



Virtual Reality

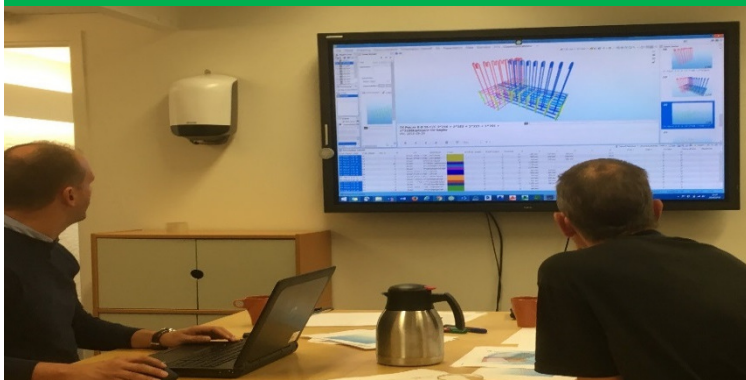


Rebar assembly directly from BIM

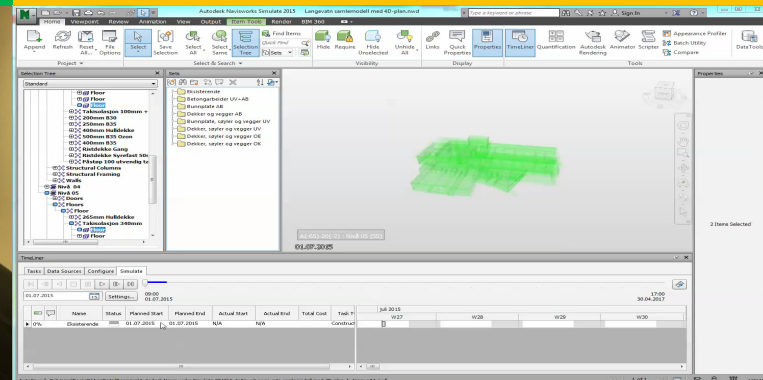

4D Scheduling (3D model + time)

VDC ved Tønsbergprosjektet

Produkt, prosess, organisering etter moderne praksis.

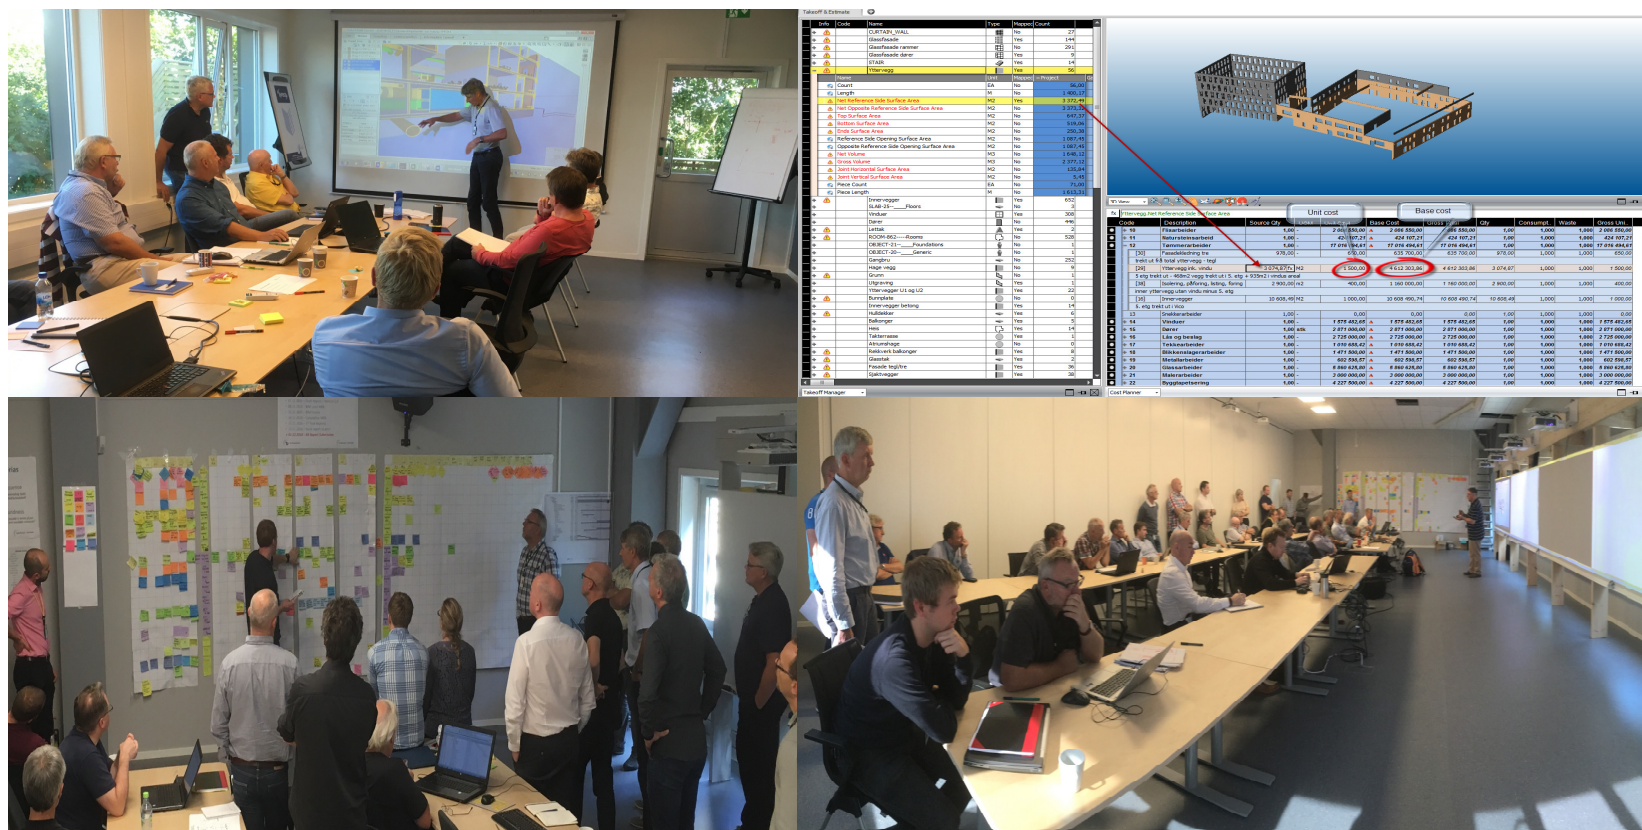

ICE – møte



Kjerneverdier i ICE:

- Spesifikk agenda og klare mål
- Svært godt forberedt
- Aktiv oppgaveløsning med visuelle verktøy
- Tydelig kontroll underveis
- Evaluering og kontinuerlig forbedring
